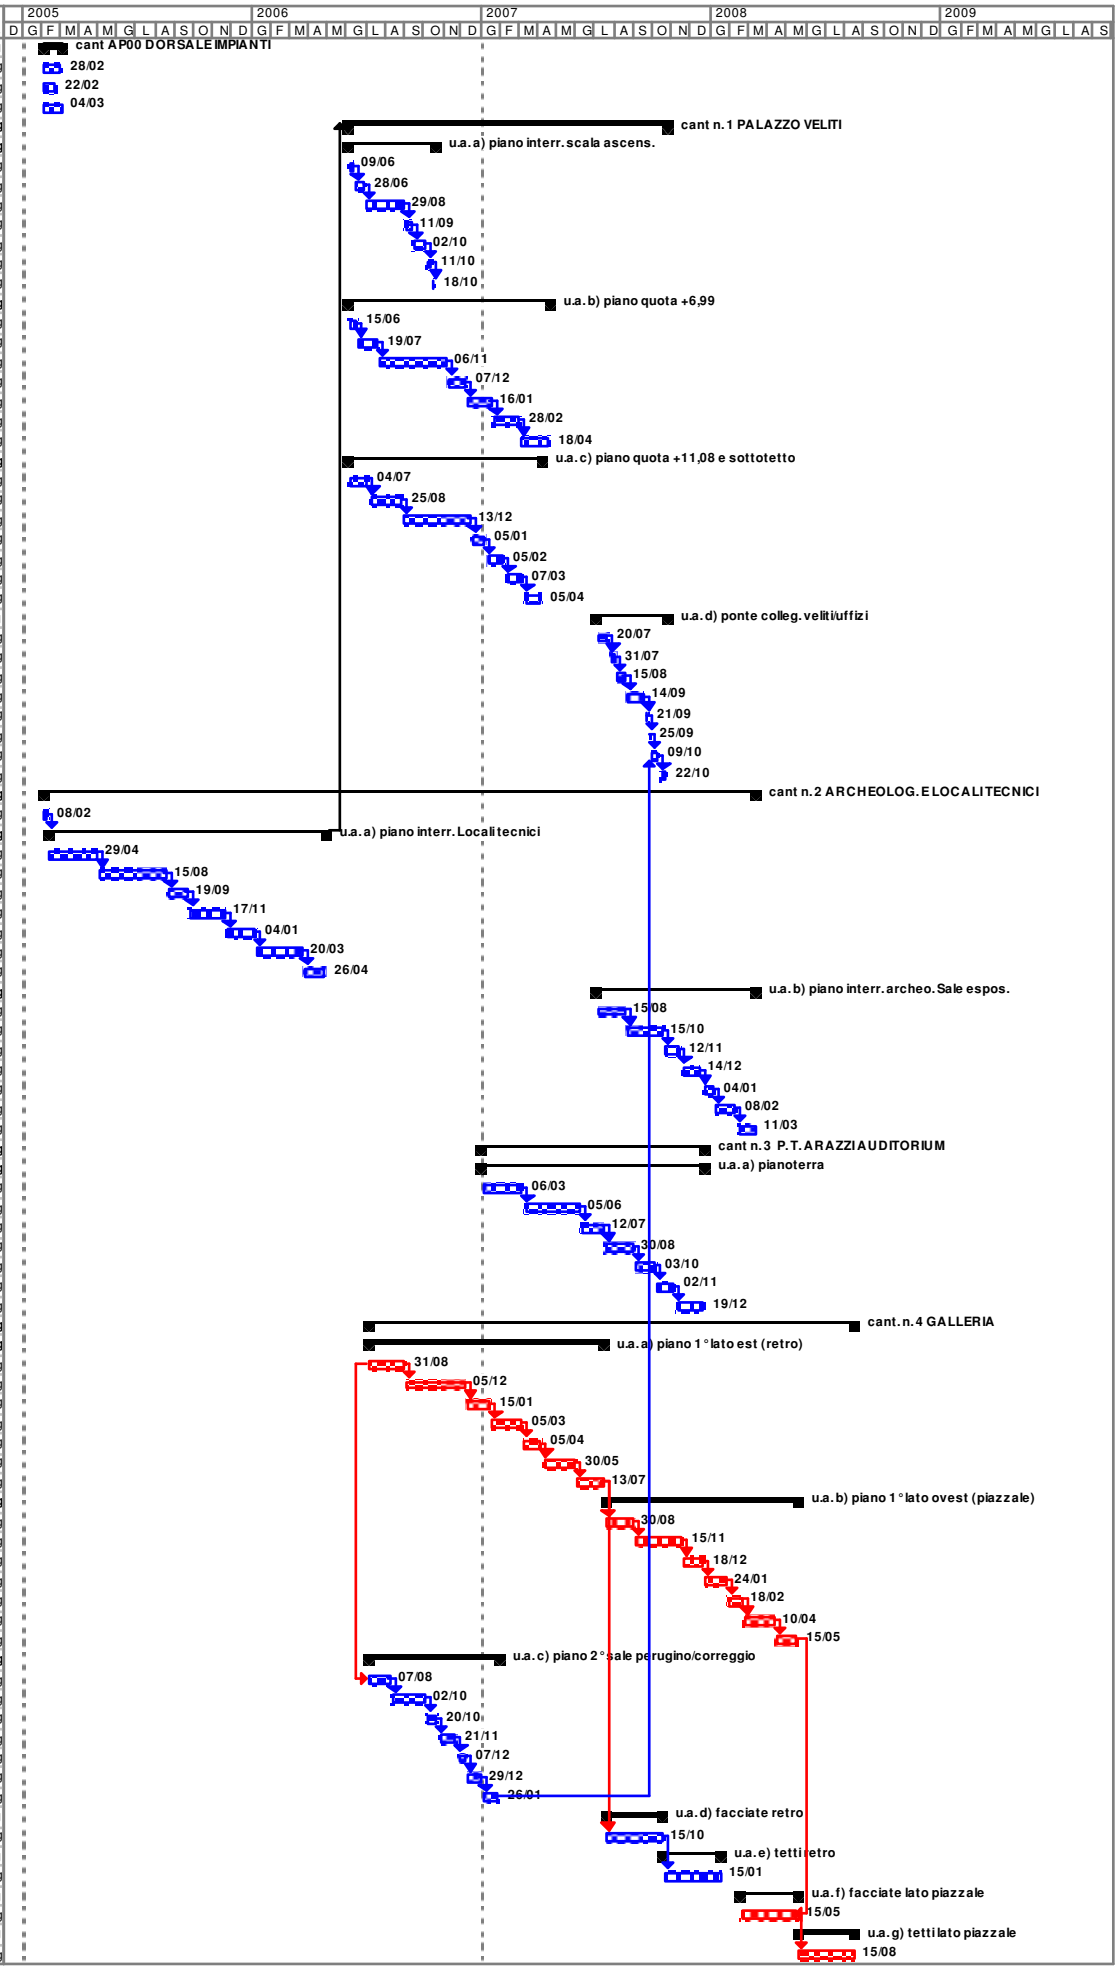ID	Nome attività	Durata
1	**cant AP00 DORSALE IMPIANTI**	**24 g**
2	cunicolo	20 g
3	cavedi	16 g
4	fossa biologica	24 g
5	**cant n.1 PALAZZO VELITI**	**363 g**
6	**u.a.a) piano interr.scala ascens.**	**100 g**
7	demolizioni	7 g
8	consolidam	13 g
9	predisp impianti	44 g
10	murature solai soffitti	9 g
11	montaggio imp	15 g
12	intonaci pav rivest	7 g
13	infissi e finiture	5 g
14	**u.a.b) piano quota +6,99**	**230 g**
15	demolizioni	11 g
16	consolidam	24 g
17	predisp impianti	78 g
18	murature solai soffitti	23 g
19	montaggio imp	28 g
20	intonaci pav rivest	31 g
21	infissi e finiture	35 g
22	**u.a.c) piano quota +11,08 e sottotetto**	**221 g**
23	demolizioni	24 g
24	consolidam	38 g
25	predisp impianti	78 g
26	murature solai soffitti	17 g
27	montaggio imp	21 g
28	intonaci pav rivest	22 g
29	infissi e finiture	21 g
30	**u.a.d) ponte colleg. veliti/uffizi**	**81 g**
31	ponteggi	15 g
32	demolizioni	7 g
33	consolidam	11 g
34	predisp impianti	22 g
35	murature solai soffitti	5 g
36	montaggio imp	2 g
37	pavimenti	10 g
38	infissi e finiture	9 g
39	**cant n.2 ARCHEOLOG. E LOCALI TECNICI**	**811 g**
40	allestimento cantiere	6 g
41	**u.a.a) piano interr. Locali tecnici**	**316 g**
42	demolizioni	58 g
43	consolidam	76 g
44	predisp impianti	25 g
45	murature solai soffitti	43 g
46	montaggio imp	34 g
47	intonaci pav rivest	53 g
48	infissi e finiture	27 g
49	**u.a.b) piano interr. archeo. Sale espos.**	**182 g**
50	demolizioni	33 g
51	consolidam	43 g
52	predisp impianti	20 g
53	murature solai soffitti	24 g
54	montaggio imp	15 g
55	intonaci pav rivest	25 g
56	infissi e finiture	22 g
57	**cant n.3 P.T. ARAZZI AUDITORIUM**	**253 g**
58	**u.a.a) pianoterra**	**253 g**
59	demolizioni	47 g
60	consolidam	65 g
61	predisp impianti	27 g
62	murature solai soffitti	35 g
63	montaggio imp	24 g
64	intonaci pav rivest	22 g
65	infissi e finiture	33 g
66	**cant. n.4 GALLERIA**	**555 g**
67	**u.a.a) piano 1° lato est (retro)**	**270 g**
68	demolizioni	44 g
69	consolidam	68 g
70	predisp impianti	29 g
71	murature solai soffitti	35 g
72	montaggio imp	23 g
73	intonaci pav rivest	39 g
74	infissi e finiture	32 g
75	**u.a.b) piano 1° lato ovest (piazzale)**	**219 g**
76	demolizioni	34 g
77	consolidam	55 g
78	predisp impianti	23 g
79	murature solai soffitti	27 g
80	montaggio imp	17 g
81	intonaci pav rivest	38 g
82	infissi e finiture	25 g
83	**u.a.c) piano 2° sale perugino/correggio**	**150 g**
84	demolizioni	26 g
85	consolidamento	40 g
86	predisp impianti	14 g
87	murature solai soffitti	22 g
88	montaggio imp	12 g
89	intonaci pav rivest	16 g
90	infissi e finiture	20 g
91	**u.a.d) facciate retro**	**66 g**
92	facciate	66 g
93	**u.a.e) tetti retro**	**66 g**
94	tetti	66 g
95	**u.a.f) facciate lato piazzale**	**66 g**
96	facciate	66 g
97	**u.a.g) tetti lato piazzale**	**66 g**
98	tetti	66 g
