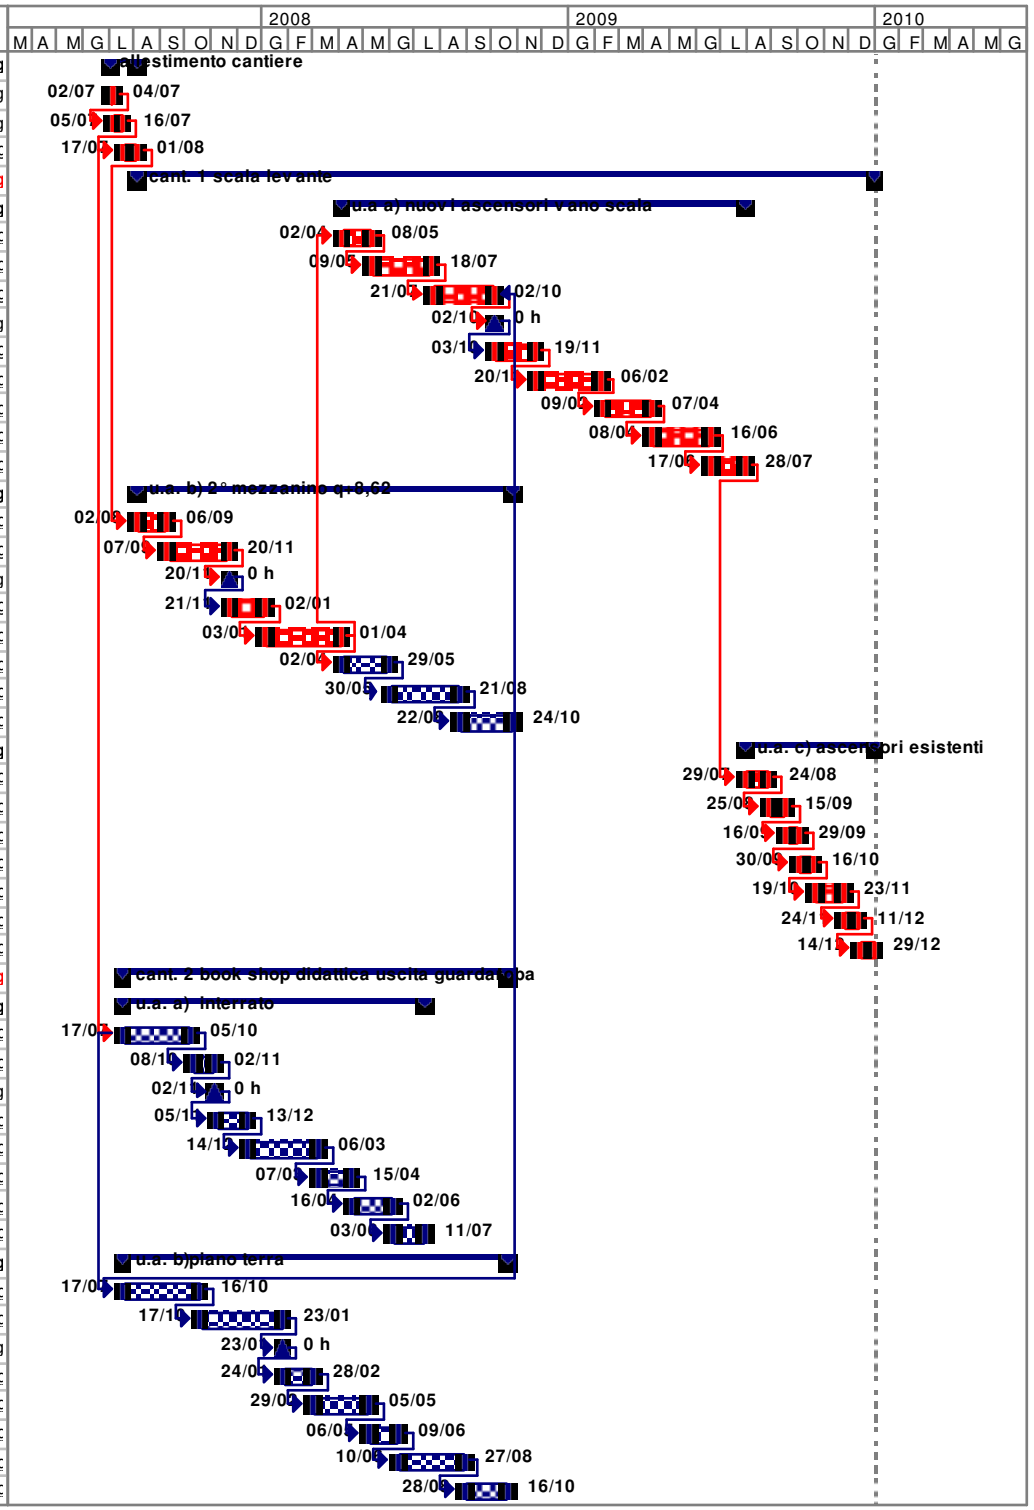ID	Nome attività	Durata
1	**allestimento cantiere**	**23 g**
2	montaggio gru	3 g
3	montaggio protezione rampa	8 g
4	montaggio piattaforma	12 g
5	**cant. 1 scala levante**	**629 g**
6	**u.a a) nuovi ascensori vano sca**	**345 g**
7	scavo fondazione	27 g
8	demolizioni	51 g
9	consolidamenti	54 g
10	quota imp. Trasversale	0 g
11	predisp. Impianti	34 g
12	murature solai soffitti	57 g
13	montaggio impianti	42 g
14	intonaci pavrivest	50 g
15	infissi finiture	30 g
16	**u.a. b) 2° mezzanino q+8,62**	**322 g**
17	demolizioni	26 g
18	consolidamenti	53 g
19	quota imp. Trasversale	0 g
20	predisp. Impianti	31 g
21	murature solai soffitti	64 g
22	montaggio impianti	42 g
23	intonaci pavrivest	60 g
24	infissi finiture	46 g
25	**u.a. c) ascensori esistenti**	**110 g**
26	demolizioni	19 g
27	consolidamenti	16 g
28	predisp. Impianti	10 g
29	murature solai soffitti	13 g
30	montaggio impianti	26 g
31	intonaci pavrivest	14 g
32	infissi finiture	12 g
33	**cant. 2 book shop didattica uscita gua**	**328 g**
34	**u.a. a) interrato**	**259 g**
35	demolizioni	59 g
36	consolidamenti	20 g
37	quota imp. Trasversale	0 g
38	predisp. Impianti	29 g
39	murature solai soffitti	60 g
40	montaggio impianti	28 g
41	intonaci pavrivest	34 g
42	infissi finiture	29 g
43	**u.a. b)piano terra**	**328 g**
44	demolizioni	66 g
45	consolidamenti	71 g
46	quota imp. Trasversale	0 g
47	predisp. Impianti	26 g
48	murature solai soffitti	47 g
49	montaggio impianti	25 g
50	intonaci pavrivest	57 g
51	infissi finiture	36 g
